

## BITÁCORA DE OBRA


No. NOTA: 01FECHA: 24-Abril-2018

Con esta fecha se recibe de manera formal el área de trabajo donde se realizará el trabajo correspondiente al contrato de obra, rehabilitación de espacio para bodega.

En recorrido de obra se hace el reconocimiento del área y se dispone del inmueble para el inicio de los trabajos.

Se autorizan dos copiones de estacionamiento para realizar carga y descarga de materiales, así como el almacenamiento de los mismos.

Arq. Mo. del Rosario  
Lima Perú



## BITÁCORA DE OBRA

No. NOTA:

02


FECHA:

25-Abril-2008

Se informa a vigilancia que se realizará el suministro de materiales que serán utilizados para el desarrollo de los trabajos, de igual manera se toman medidas y se realiza un levantamiento del área existente para la elaboración de reportes.

Se realiza el acordonamiento con cinta de precaución en el área designada para protección de los peatones.

Arq. Ma. del Rosario  
Ismael Jerez




## BITÁCORA DE OBRA

No. NOTA: 03FECHA: 26-Abril-2018

Con esta fecha se incorpora al área de trabajo una cuadrilla de mano de obra, la cual realiza trabajos preliminares, se les proporciona la información necesaria para el desplante del muro divisorio de acuerdo a lo indicado.

Se realiza la demolición del piso de concreto y excavación para el anclaje de castillos.

Arq. Mo. del Rosario  
Ismael Juárez



## BITÁCORA DE OBRA


No. NOTA:

04

FECHA: 27-Abril-2018

Se informa que se han colocado los castillos de armex reforzado con varilla del No. 3 en los sitios indicados, respetando el ancho establecido para el acceso a la bodega. Así mismo se cuele el piso de concreto a nivel de piso terminado donde se realiza el anclaje, se descimba la cadena de desplante y se comienza con la construcción de muro de block.

Arq. Mari-del Rosario  
Lima Suárez




BITÁCORA DE OBRA

Nº. NOTA: 05

FECHA: 28-Abril-2018

Se realiza el colado de castillos con concreto hasta la altura de la cadena intermedia que se obra a la altura del acceos. Así mismo se cimbra la cadena intermedia que será colada por la tarde.

Arq. Ma. del Rosario  
Jiménez




BITÁCORA DE OBRA

Nº. NOTA: 06

FECHA: 30-Abril-2018

Se informa que se ha concluido la construcción del muro de block con sus cadenas y castillos de concreto, hoy se realiza el aplomado de los marcos y bocanillas en puerta y ventanas.

Arq. No. del Rosario  
Lima Juárez




BITÁCORA DE OBRA

No. NOTA: 07

FECHA: 07-Mayo-2018

Con esta fecha se realiza limpieza en el área, se retira el escombros generado así como desperdicios, se aplica el aplanado fino y se dejará fraguar para recibir pintura.

Arq. Na. del Rosario  
Lima Jorez



## BITÁCORA DE OBRA

No. NOTA:

08

FECHA: 03-Mayo-2018

Se realiza la preparación de la superficie de los marcos que se pintarán, se retira el excedente de polvo y se aplica sellador en marcos interiores y exteriores para recibir pintura.


Se presenta el área a el aluminero para tomar medidas de los vanos para la realización y colocación de cancelería.

Arq. Ma del Rosario  
Lima Juárez



DESCRIPCION OBRA: REHABILITACION DE BODEGA  
 UBICACION: OFICINAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 LOCALIDAD: CENTRO  
 MUNICIPIO: TLAXCALA DE XICHTENCATL  
 PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE ABRIL DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2018  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$16,196.04  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 28 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE MAYO DE 2018  
 ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO  
 IMPORTE DE ESTIMACION: \$16,196.04

ERL DESIGNER CONSTRUCTION





ESTIMACION No.

1 (UNO) FINIQUITO

OBSERVACIONES

REPORTE FOTOGRAFICO

1 ALB.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASTILLOS DALA O CADENA A BASE DE ARMEX DE 15X15CM CON VARILLA DE 3/8 DE REFUERZO CON CEMENTO, ARENA F<sup>c</sup>=2000/1cm<sup>3</sup>.

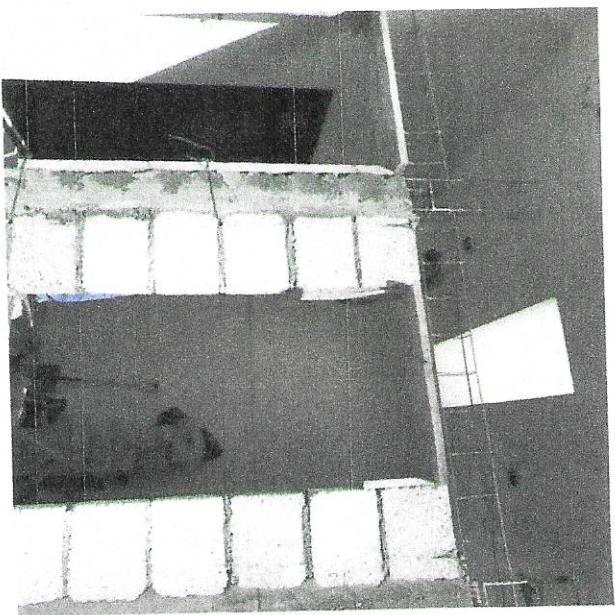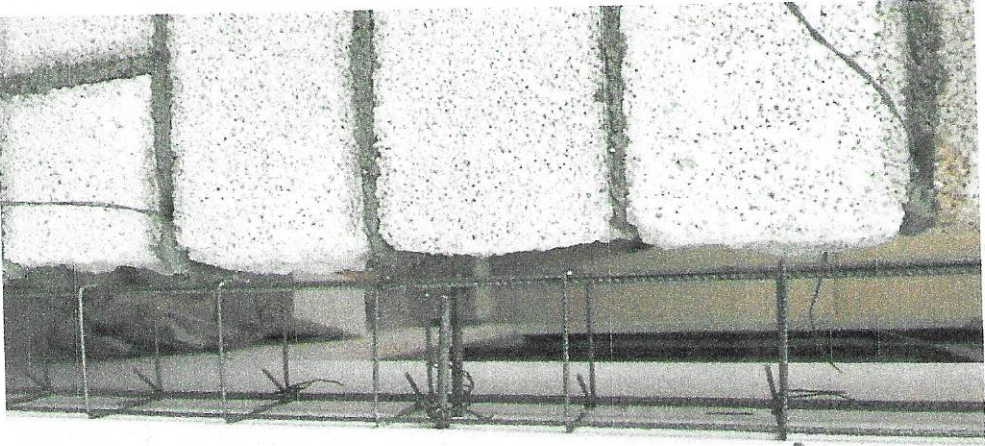


000018

ARO. MA. DEL ROSARIO LIMA JUAREZ

DESCRIPCION OBRA: REHABILITACION DE BODEGA  
 UBICACION: OFICINAS GERALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 LOCALIDAD: CENTRO  
 MUNICIPIO: TLAXCALA DE MICHOTENCATL  
 PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE ABRIL DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2018  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$16,196.04  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 26 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE MAYO DE 2018  
 ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO  
 IMPORTE DE ESTIMACION: \$16,196.04

ERLUI S EN RECONSTRUCCION




ESTIMACION No.

1 (UNO) FINIQUITO

OBSERVACIONES

REPORTE FOTOGRAFICO

2 ALB2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO MACIZO 12X20CM ASENTADO CON MORTERO 1:5 A PLOMO CON HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.

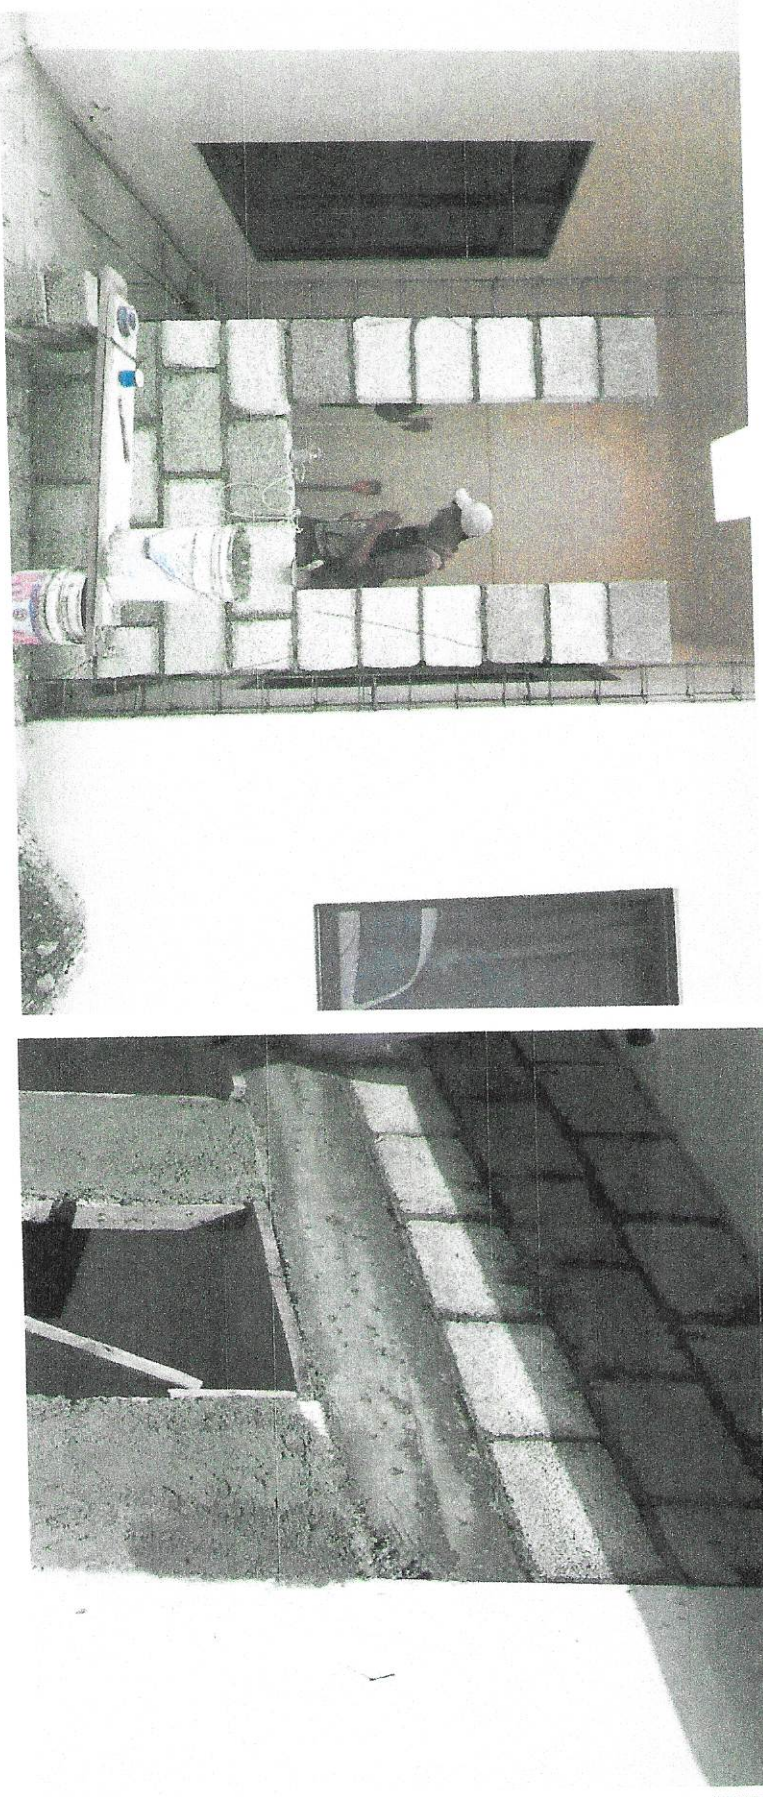


ARQ. MA. DEL ROSARIO LIMA JUAREZ

019

DESCRIPCION OBRA: REHABILITACION DE BODEGA  
 UBICACION: OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 LOCALIDAD: CENTRO  
 MUNICIPIO: TLAXCALA DE MICHOTENCATL  
 PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE ABRIL DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2018  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$15,196.04  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 28 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE MAYO DE 2018  
 ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO  
 IMPORTE DE ESTIMACION: \$15,196.04

ERUDISENORCONSTRUCCION




ESTIMACION No.

1 (UNO) FINIQUITO

OBSERVACIONES

REPORTE FOTOGRAFICO

3 ALB.3 SUMINISTRO Y APLICACION DE REPELLADO Y APLANADO FINO CON MORTERO, CEMENTO AREANA A PLOMO AMBAS CARPAS.

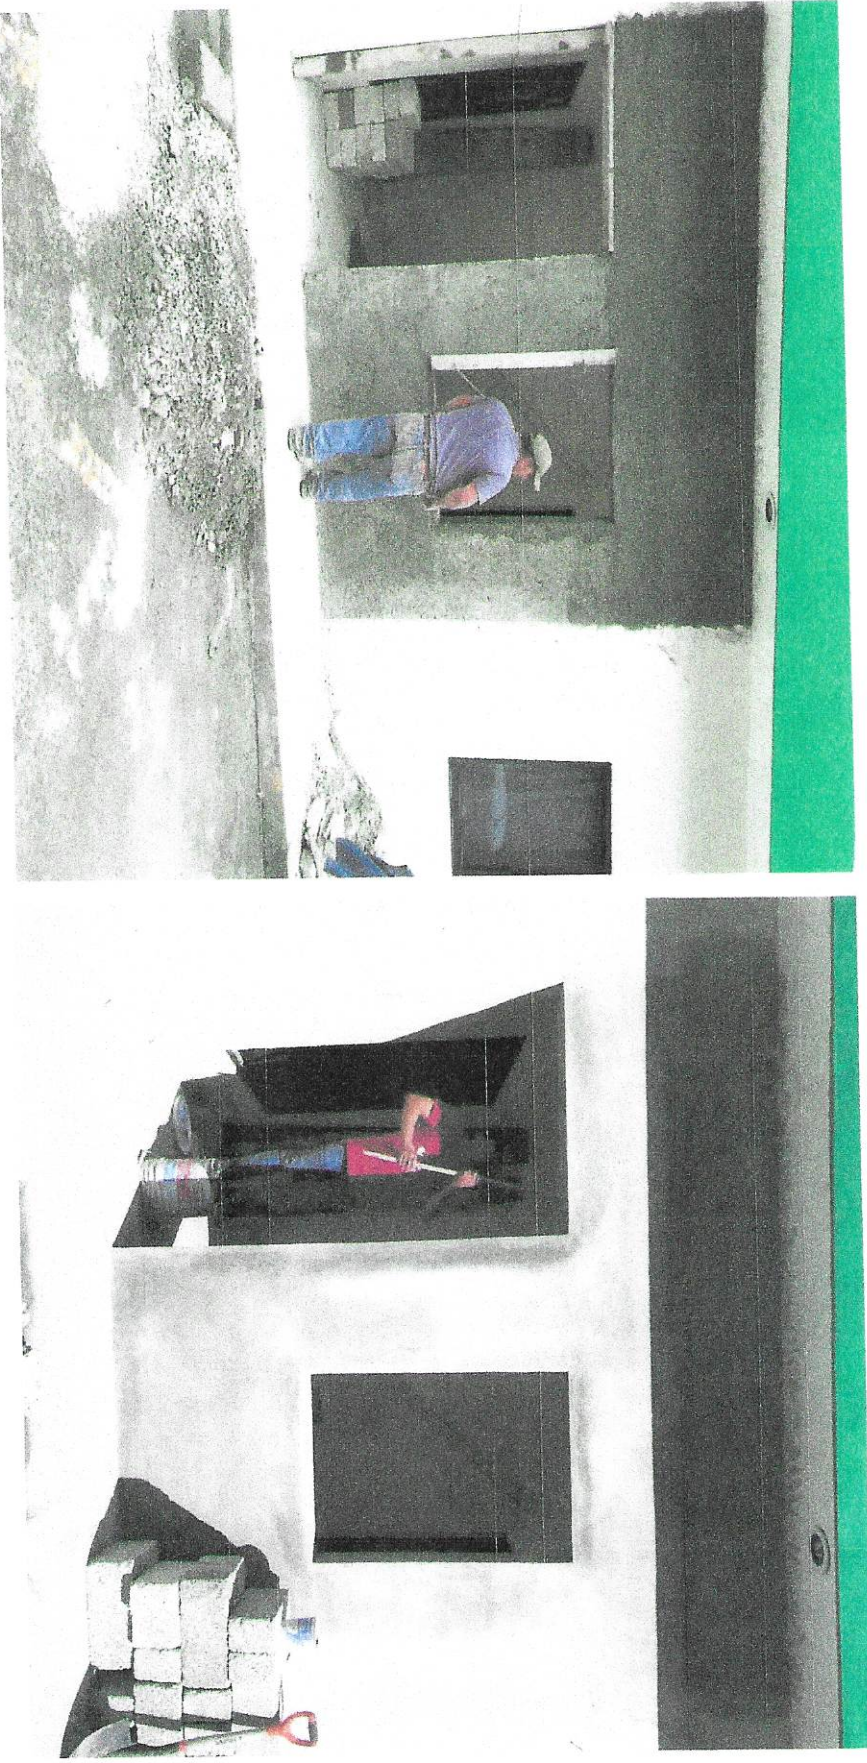


000020

ARQ. MA. DEL ROSARIO LIMA JUAREZ

DESCRIPCION OBRA: REHABILITACION DE BODEGA  
 UBICACION: OFICINAS CENTRALES COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 LOCALIDAD: CENTRO  
 MUNICIPIO: TLAXCALA DE XICOTENCATL  
 PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE ABRIL DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2018  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$16,195.04  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 26 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE MAYO DE 2018  
 ESTIMACION No. 01 (JUNO) FINIQUITO  
 IMPORTE DE ESTIMACION: \$16,195.04

ERIDISENORCONSTRUCCION



ESTIMACION No. 1 (JUNO) FINIQUITO

REPORTE FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES


4 AOA.1 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMER O SIMILAR EN TODA EL AREA DE LA BODEGA.



ARQ. MA. DEL ROSARIO LIMA JUAREZ

DESCRIPCION OBRA: REHABILITACION DE BODEGA  
 UBICACION: OFICINAS CEL 29 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 LOCALIDAD: CENTRO  
 MUNICIPIO: TLAXCALA DE MICOHTENCATL  
 PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE ABRIL DE 2018 AL 16 DE MAYO DE 2018  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$16,196.04  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 26 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE MAYO DE 2018  
 ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO  
 IMPORTE DE ESTIMACION: \$16,196.04

ERLOSERORCONSTRUCCION




ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

**REPORTE FOTOGRAFICO**

OBSERVACIONES

5 CANC. 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL AHUMADO DE COLOR NEGRO DE 4MM DE ESPESOR CON CHAPA INCLUIDA DE 2.18X1.00M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.

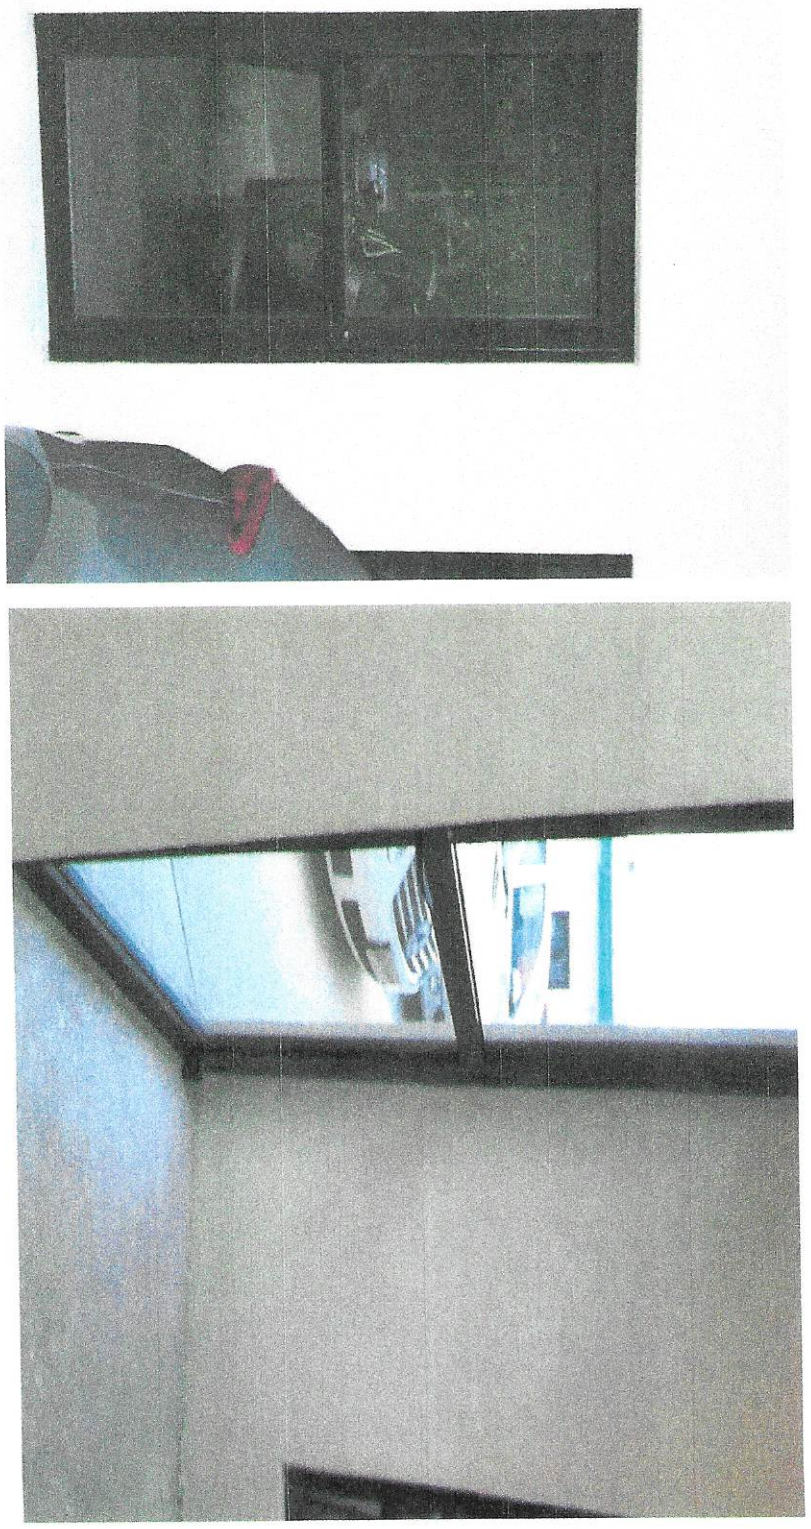


REV 022

ARQ. MA. DEL ROSARIO LIMA JUAREZ

DESCRIPCION OBRA: REHABILITACION DE BODEGA  
 UBICACION: OFICINAS CEN... COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 LOCALIDAD: CENTRO  
 MUNICIPIO: TLAXCALA DE XICOTENCATL  
 PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE ABRIL DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2018  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$16,196.04  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 26 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE MAYO DE 2018  
 ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO  
 IMPORTE DE ESTIMACION: \$16,196.04

ERDI SENOR CONSTRUCCION



ESTIMACION NO.

1 (UNO) FINIQUITO

OBSERVACIONES

**REPORTE FOTOGRAFICO**

8 CANC2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" CON CRISTAL AHUMADO DE 4MM COLOR NEGRO DE 0.78X1.18M INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.



*[Handwritten signature]*

ARQ. MA. DEL ROSARIO LIMA JUAREZ

023000
